



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

INFORME DE COMISIÓN
CEA/DC/2021/339

Nombre del Servidor Público BASILIO HERNÁNDEZ RAMOS, EAO (18)

Con el Puesto de TÉCNICO ESPECIALIZADO, Credencial Núm. _____

Adscrito a la Dirección DE CONSTRUCCIÓN

Comisionado a JAUJAL, DOMINGO GÁMEZ Y SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.; LOS MORENO, SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.; JAUJAL, DOMINGO GÁMEZ Y SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

el (los) día (s) 22 AL 23 DE JULIO DE 2021, con

número de Oficio CEA/DC/2021/339, Con el objeto de: SUPERVISIÓN DE OBRAS EJECUTORES MUNICIPIOS

Resultando de mi comisión lo siguiente:

Jueves, 22 de julio de 2021

El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Guadacazar, en la Localidad de San Ignacio, para verificar los alcances de la obra, encontrándose que la obra se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto, pero, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamineto. Por su parte la empresa contratista informó que no se ha puesto en funcionamiento por que los comites de cada localidad no se han puesto de acuerdo en la administración del sistema de agua potable.

viernes, 23 de julio de 2021

El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Guadacazar, en la Localidades de el Jaujal y Domingo Gámez para verificar los alcances de la obra, encontrándose que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovoltaica en el pozo de agua potable; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene terminada de acuerdo a catalogo, pero no han entregado evidencia de la instalación de tubería nueva en esa partida, por lo que se les ha solicitado información comprobatoria, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamineto. Al igual que en San Ignacio se informó que no se ha puesto en funcionamiento la red por que los comites de cada localidad no se han puesto de acuerdo en la administración del sistema de agua potable.

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Elaborado este informe el día **lunes, 02 de agosto de 2021**


DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

GERARDO IZQUIERDO SÁNCHEZ
JEFE DE SECCIÓN


BASILIO HERNÁNDEZ RAMOS
TÉCNICO ESPECIALIZADO
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA



SAN IGNACIO, GUADALCAZAR, S.L.P.

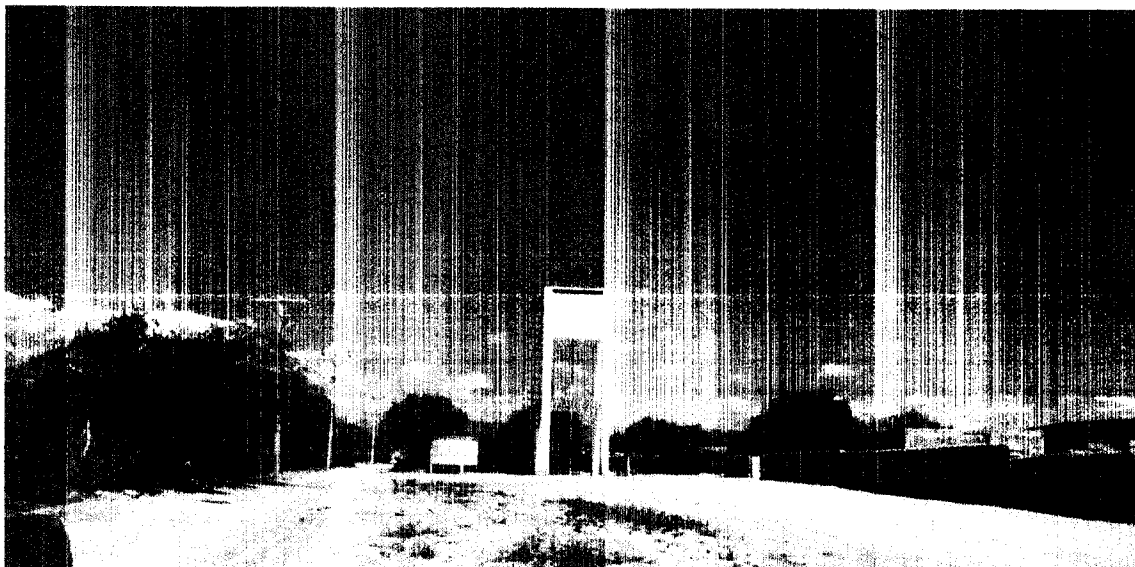

JAUJAL, GUADALCAZAR, S.L.P.

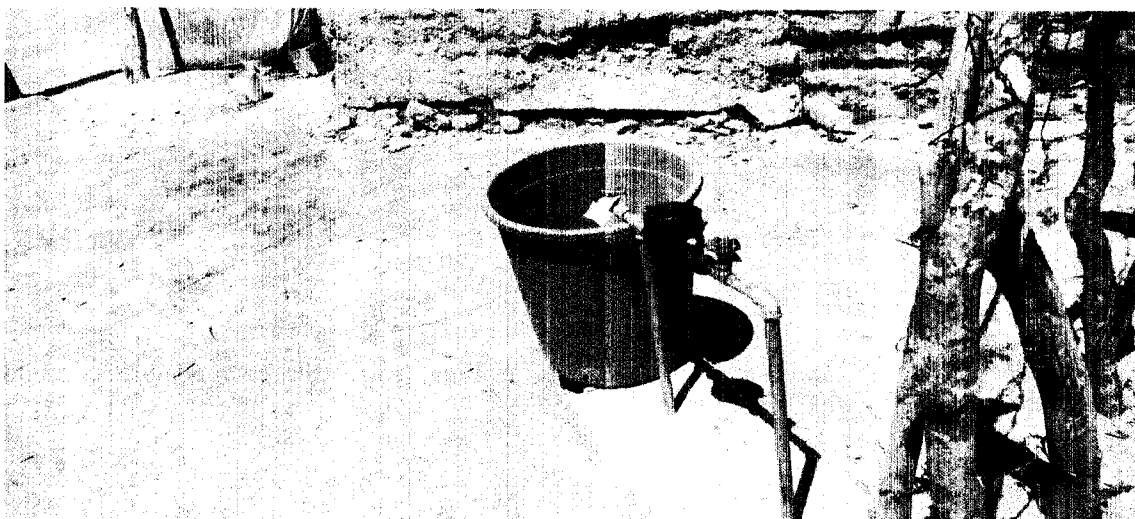

DOMINGO GAMEZ, GUADALCAZAR, S.L.P.
